

LE HAILLAN



Aménagement de l'avenue de la
République

Réunion publique

02/06/2025



Sommaire

- 1. INTRODUCTION**
- 2. LE PROJET**
- 3. LE PLANNING**
- 4. LE PHASAGE TRAVAUX**


1.

Introduction par Madame la Maire

Premier aménagement du nouveau plan de circulation

Plan de circulation cible et aménagements projetés

1 Profil validé sur Médoc

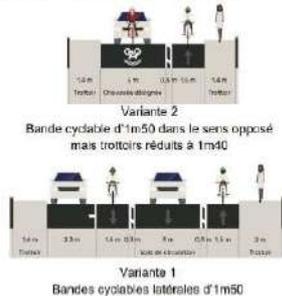


2 Profil validé sur Victor Hugo



3 Profil sur Hustin

En cours d'étude BEX
Coulir Bus Quais bus
Voie de circulation
(inversion Allée des Roseaux)

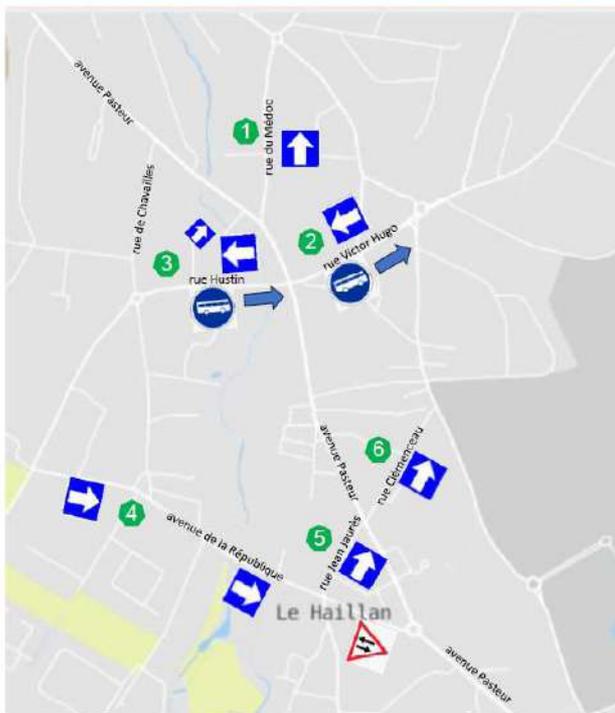

4 Profil validé sur République



5 Profil sur J. Jaurès A étudier

6 Profil Clémenceau







2.

Le projet


Principes d'aménagement d'ensemble

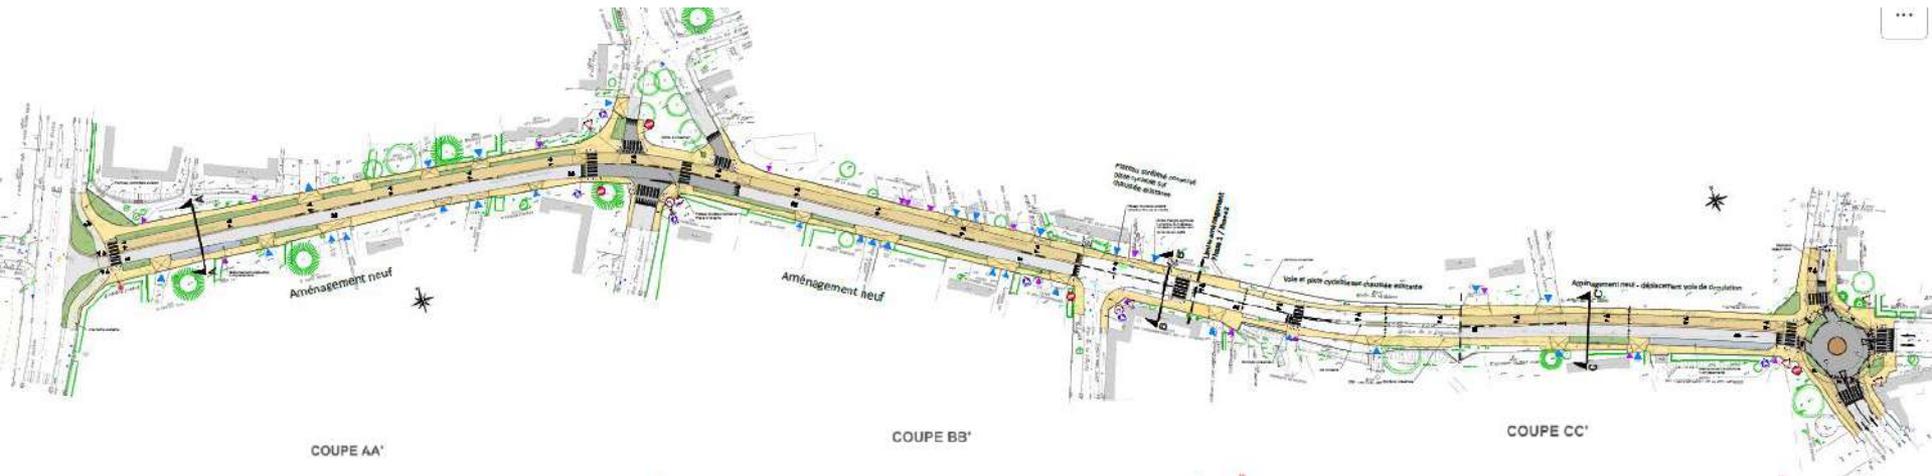


COUPE AA'

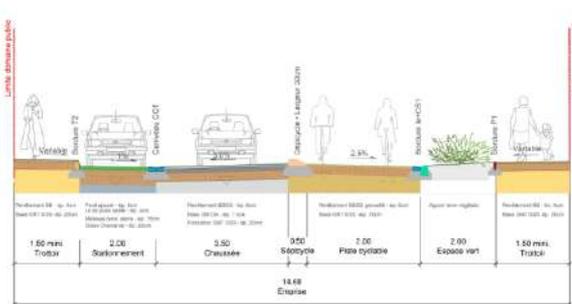


COUPE BB'

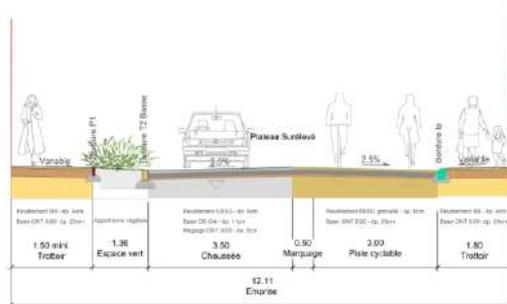

COUPE CC'

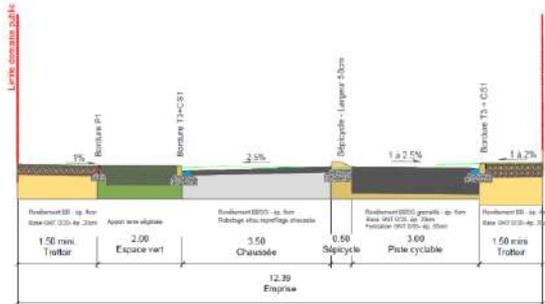

Principes d'aménagement : plan masse phase 1

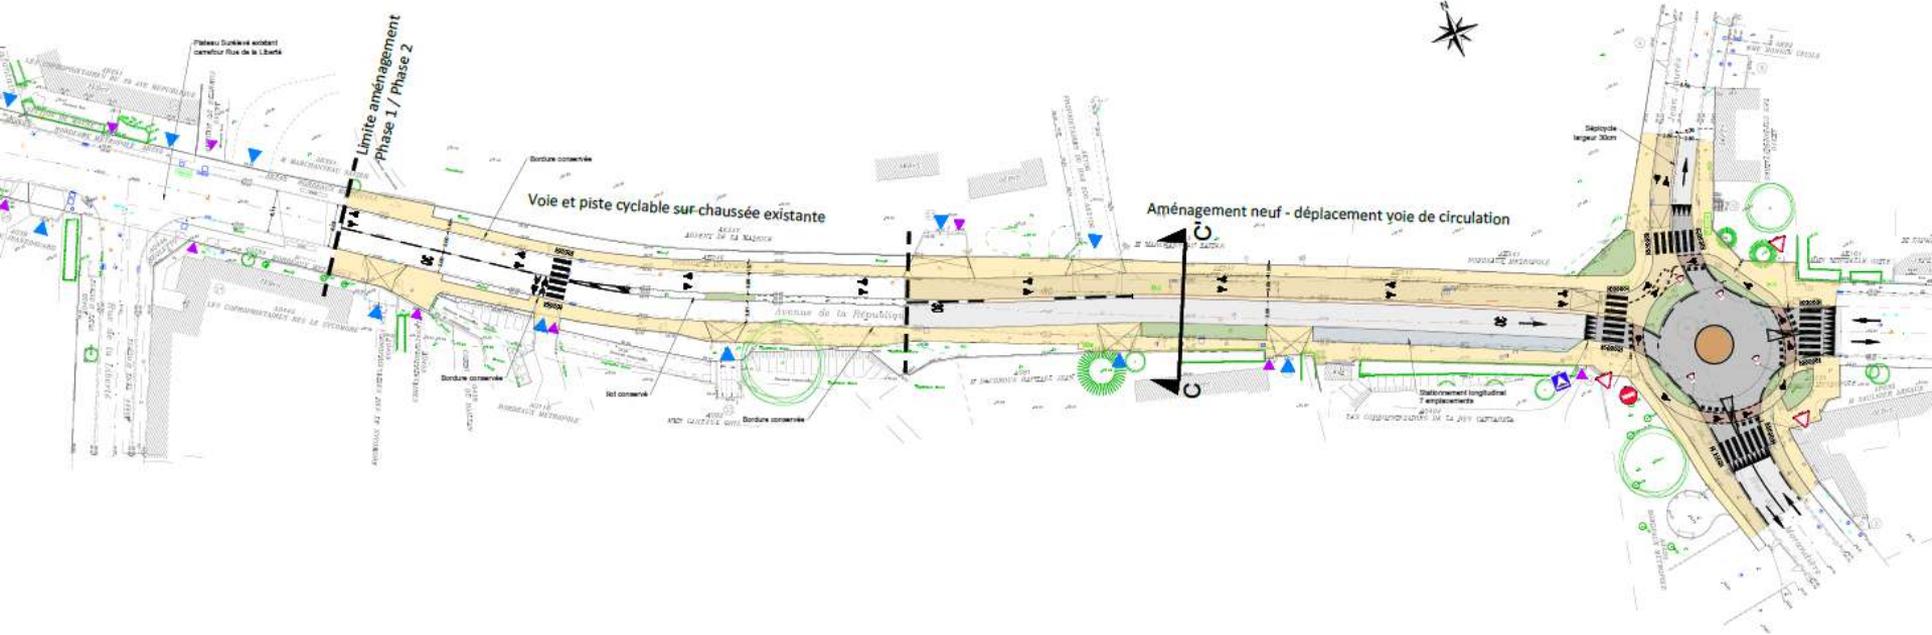

Revêtements



Trottoirs : revêtement clair

Piste cyclable : enrobé + résine claire contrastant avec le trottoir


Stationnements : dalles béton enherbées



3.

Le planning

2025									2026							
Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou
		Travaux Phase 1 République														
					Travaux assainissement											
									Etudes Phase 2		Travaux Phase 2 République					

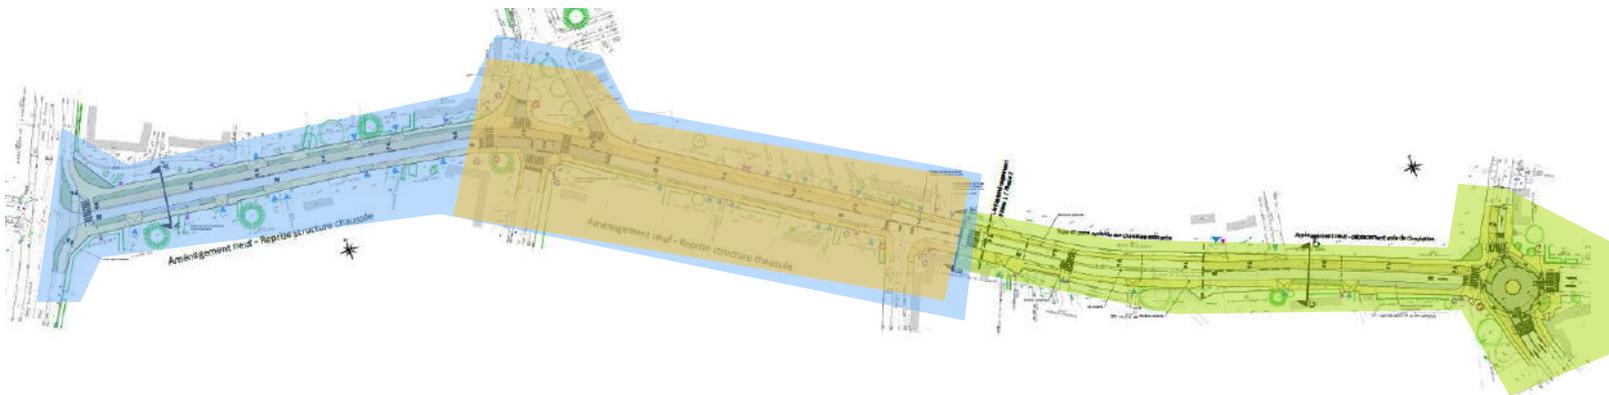




4.

Le phasage travaux



Phase 1 : Travaux de voirie giratoire de la Morandière et amorce République


2025							2026						
Avr	Mai	Jun	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai

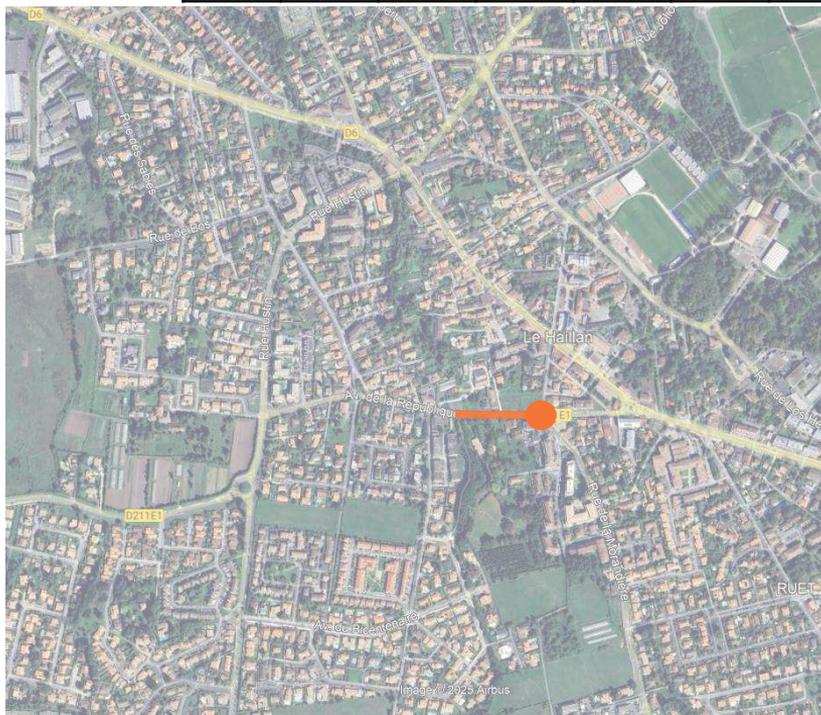

Précision(s):


- Préparation : 1 mois > mi-juin 2025
- Travaux : 3 mois > juin/juillet/août 2025 ; finitions fin septembre 2025

 Travaux voirie



Phase 0 – Préparation (démolition nord et création voie provisoire)

Jun 25				Juillet 25					Aout 25					Septembre 25			
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	

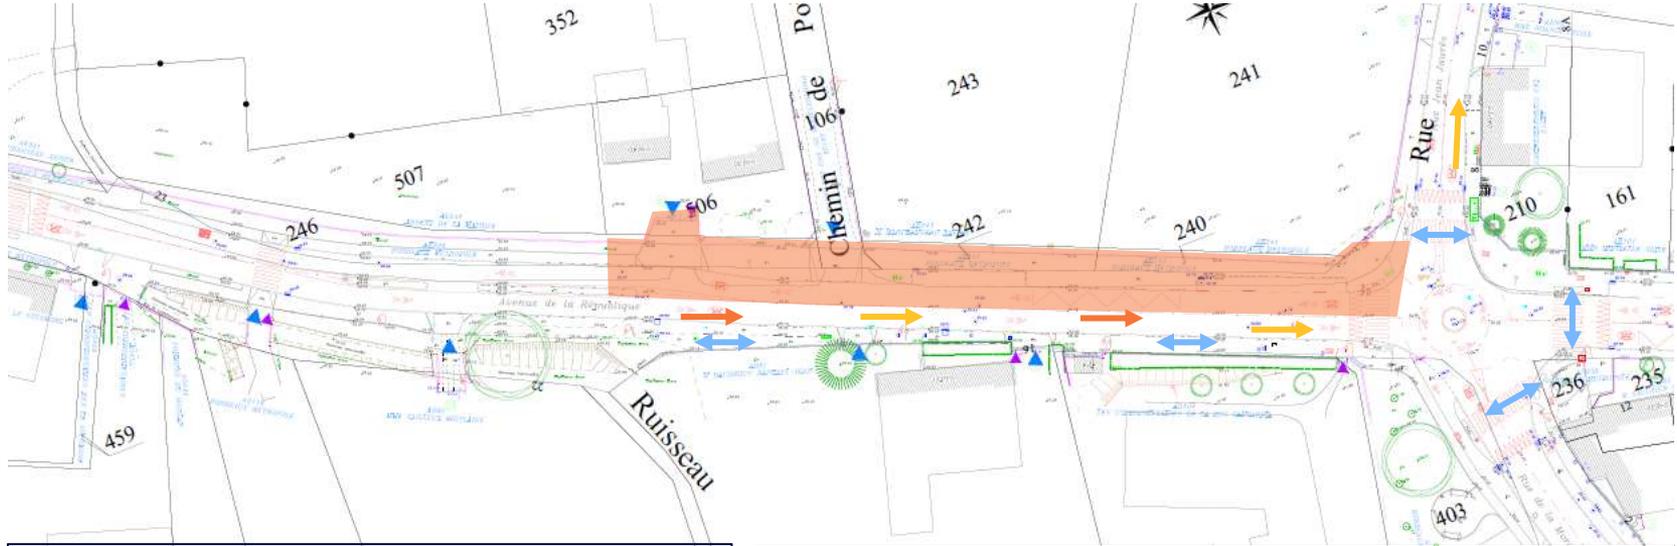


Légende :

- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne

Observations :

- **Suppression piste cyclable sur République, déviation cycles par Jaurès dans le sens est-ouest ou **pied à terre sur trottoir de la zone travaux République****
- **Circulation existante non impactée**

Phase 1 – Voirie + trottoir Sud																
Juin 25			Juillet 25					Aout 25				Septembre 25				
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39

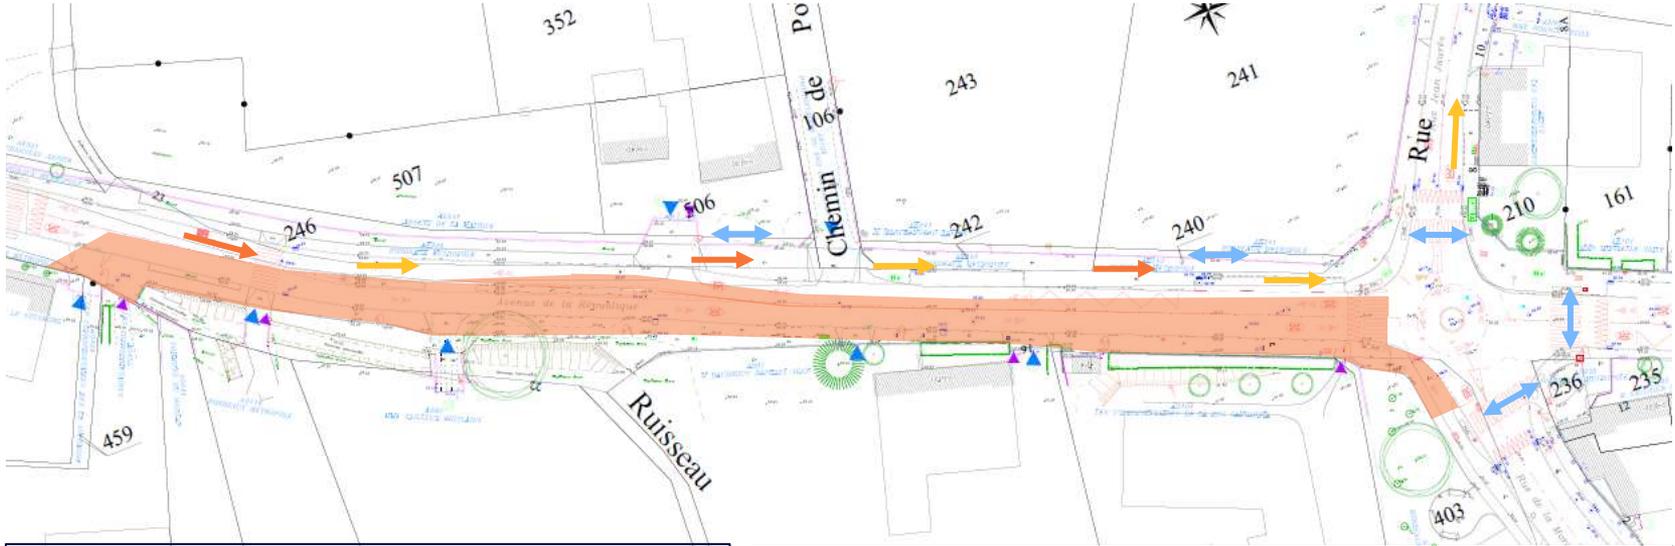

Légende :

- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne


Observations :

- Circulation République sur piste cyclable existante et voie provisoire (3m de large)
- Déviation cycles par Jaurès dans le sens est-ouest ou **ped à terre sur trottoir de la zone travaux République**
- Trottoir piéton de 1,40m minimum
- **Circulation existante non impactée**

Itinéraire conseillé pendant les travaux

Légende :


-  Zone de travaux avec alternat 3 feux
-  Double sens de circulation
-  Sens unique de circulation
-  Itinéraire conseillé

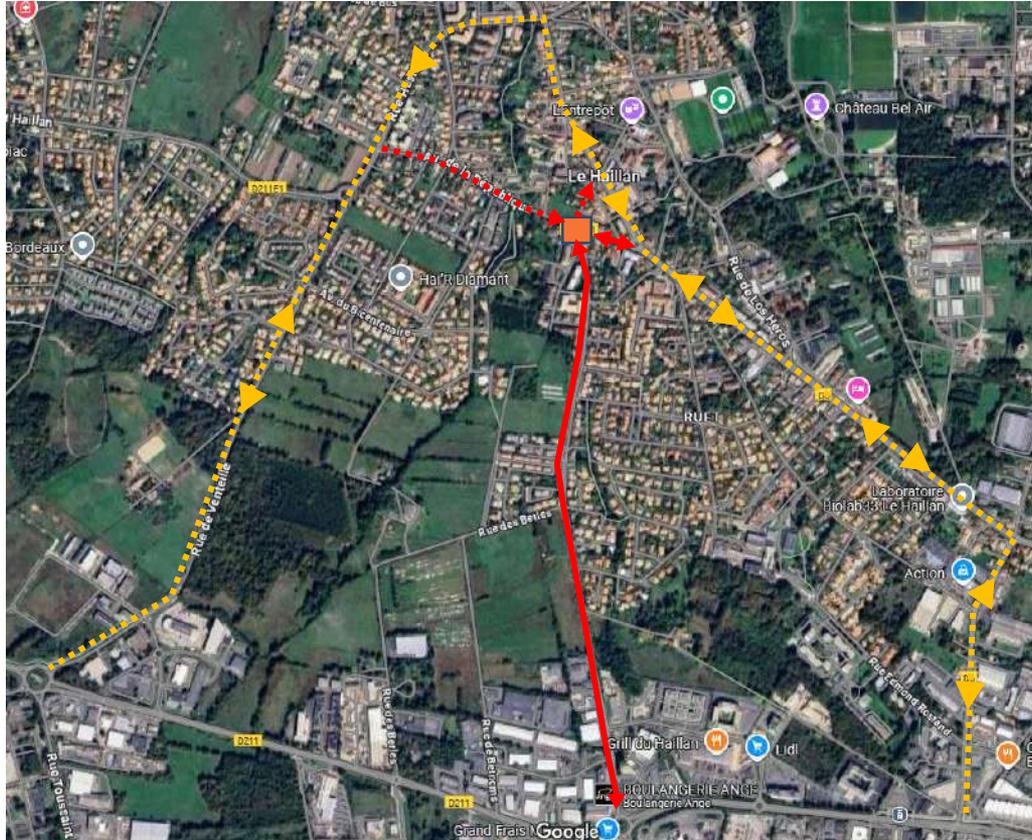

LE HAILLAN – Avenue de la République – réunion publique du 02/06/2025

Phase 2 – Oreille sud-ouest giratoire

Jun 25				Juillet 25				Aout 25				Septembre 25				
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39

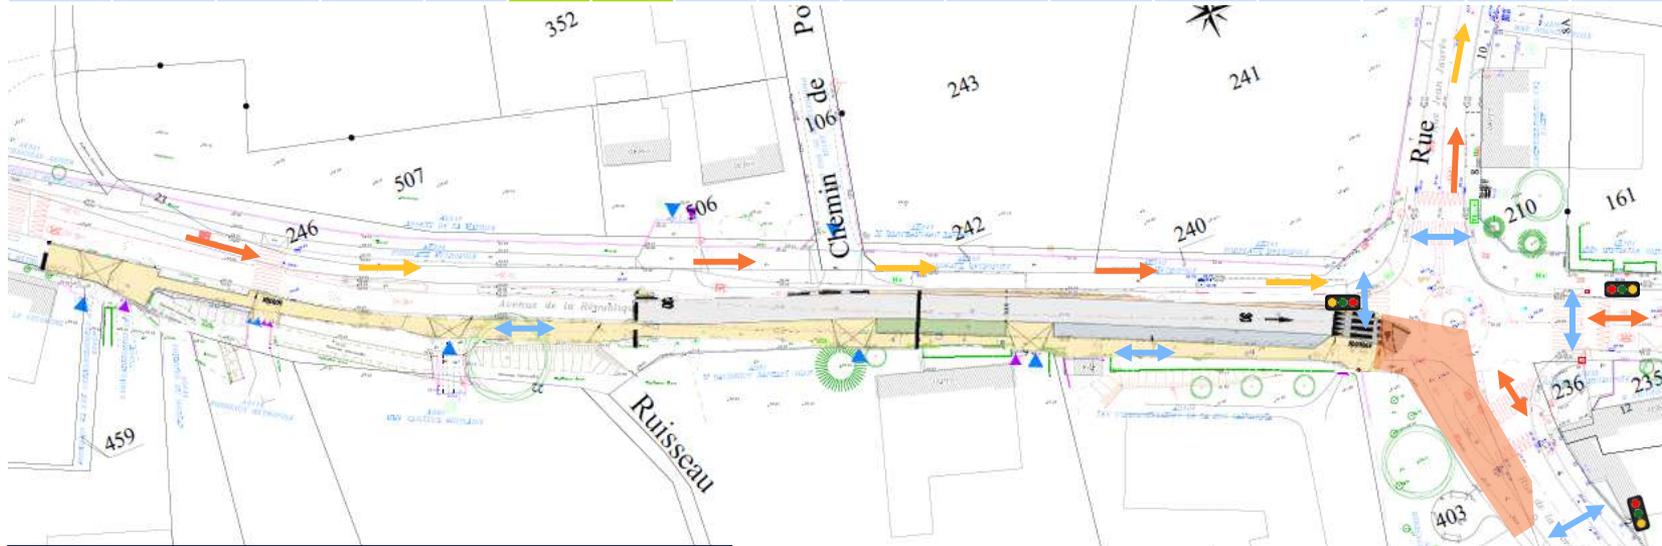


Légende :

- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne

Observations :

- Circulation République sur piste existante et voie provisoire (3m de large)
- Déviation cycles par Jaurès dans le sens est-ouest ou **ped à terre sur trottoir de la zone travaux République**
- Alternat 3 feux
- Ne comprend pas le revêtement final du plateau

Phase 3 – Oreille sud-est giratoire																	
Jun 25				Juillet 25					Aout 25					Septembre 25			
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	

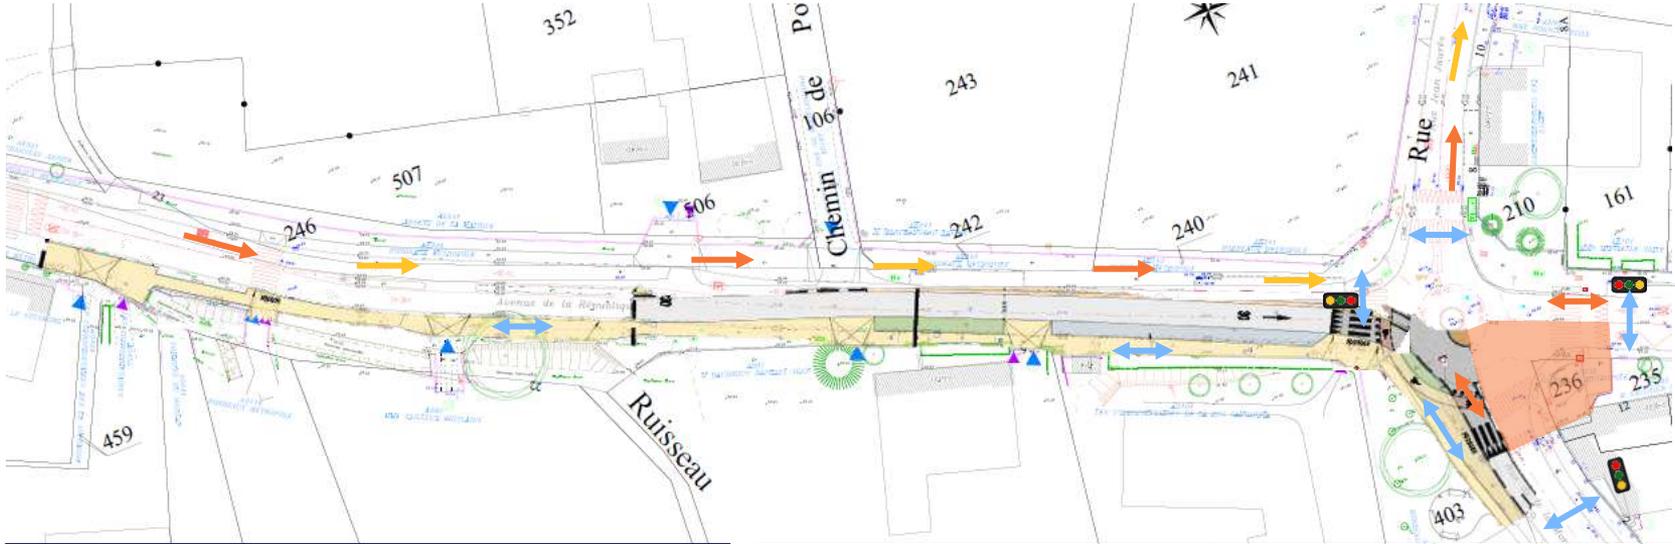


Légende :

- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne

Observations :

- Circulation République sur piste existante et voie provisoire (3m de large)
- Déviation cycles par Jaurès dans le sens est-ouest ou **ped à terre sur trottoir de la zone travaux République**
- Alternat 3 feux
- Ne comprend pas le revêtement final du plateau

Phase 4 – demi giratoire nord																
Jun 25				Juillet 25				Aout 25					Septembre 25			
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39

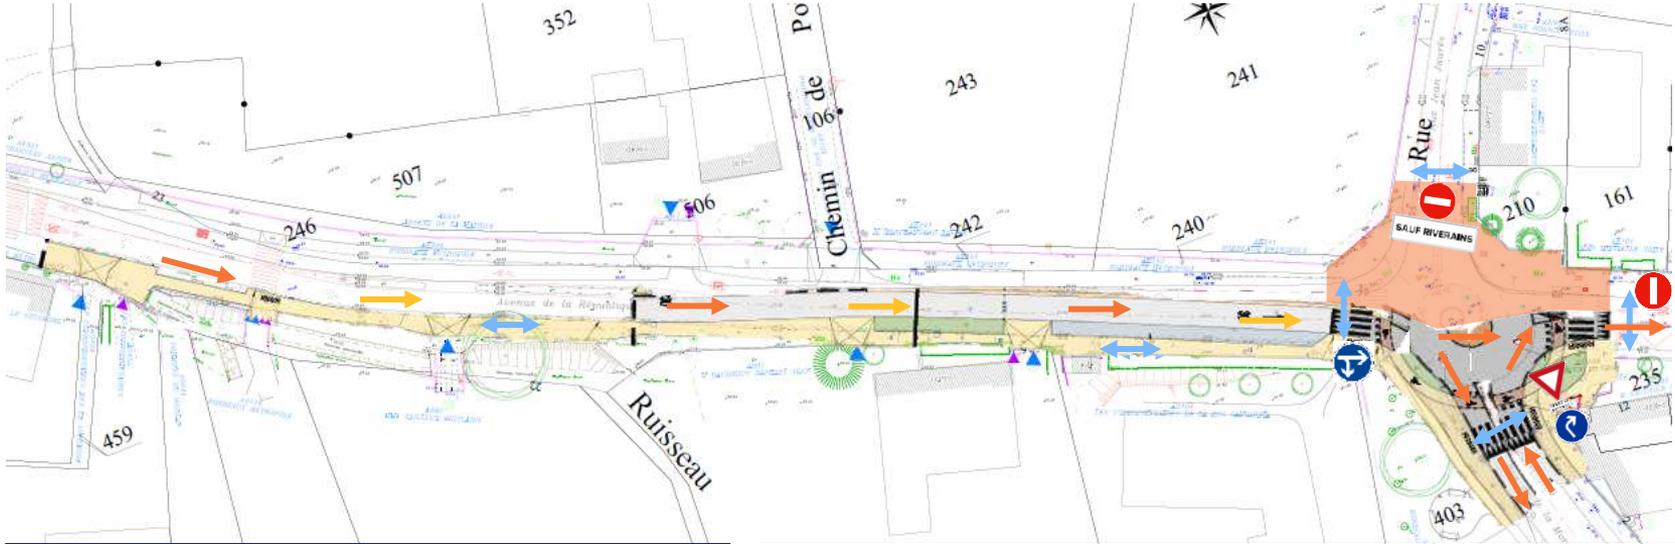


Légende :

- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne

Observations :

- Circulation République sur chaussée définitive
- Fermeture Jaurès (déviation cycles et circulation par République Est + Pasteur)
- Mise en œuvre de l'itinéraire conseillé comme déviation durant cette phase travaux (car blocage République Est dans le sens Est-Ouest)


Itinéraire de déviation pendant les travaux

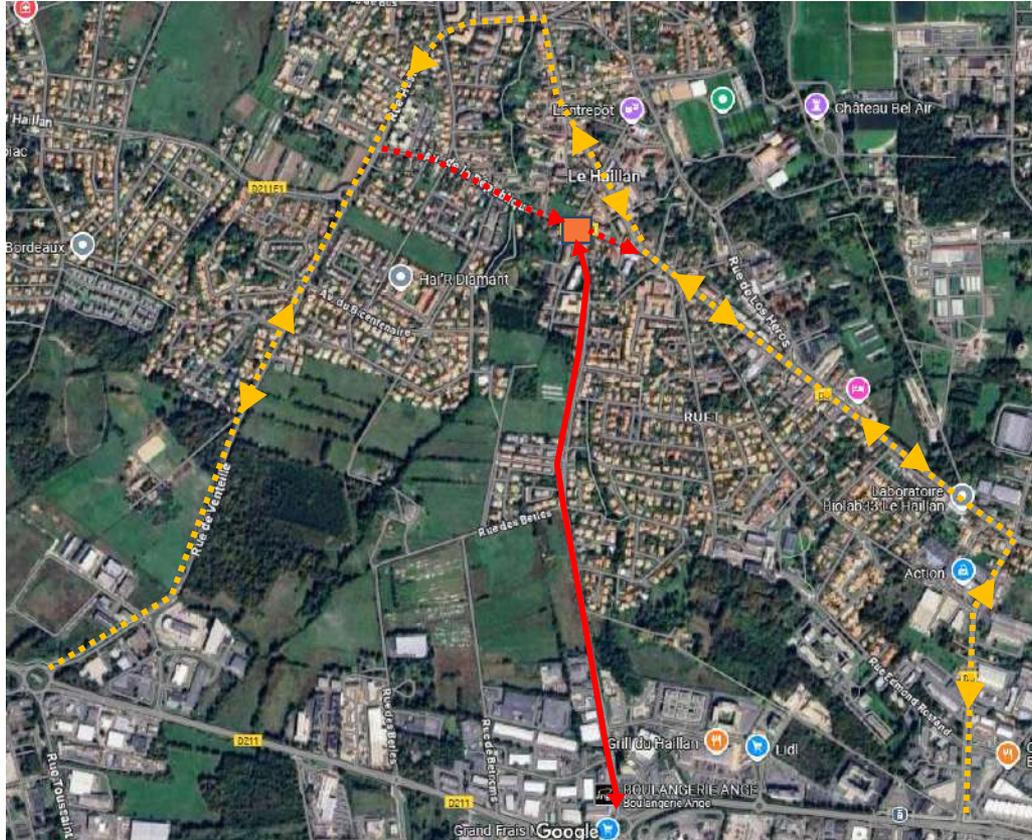

Légende :

-  Zone de travaux
-  Double sens de circulation
-  Sens unique de circulation
-  Itinéraire conseillé

Phase 5 – piste + trottoir nord																
Juin 25				Juillet 25					Aout 25				Septembre 25			
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39

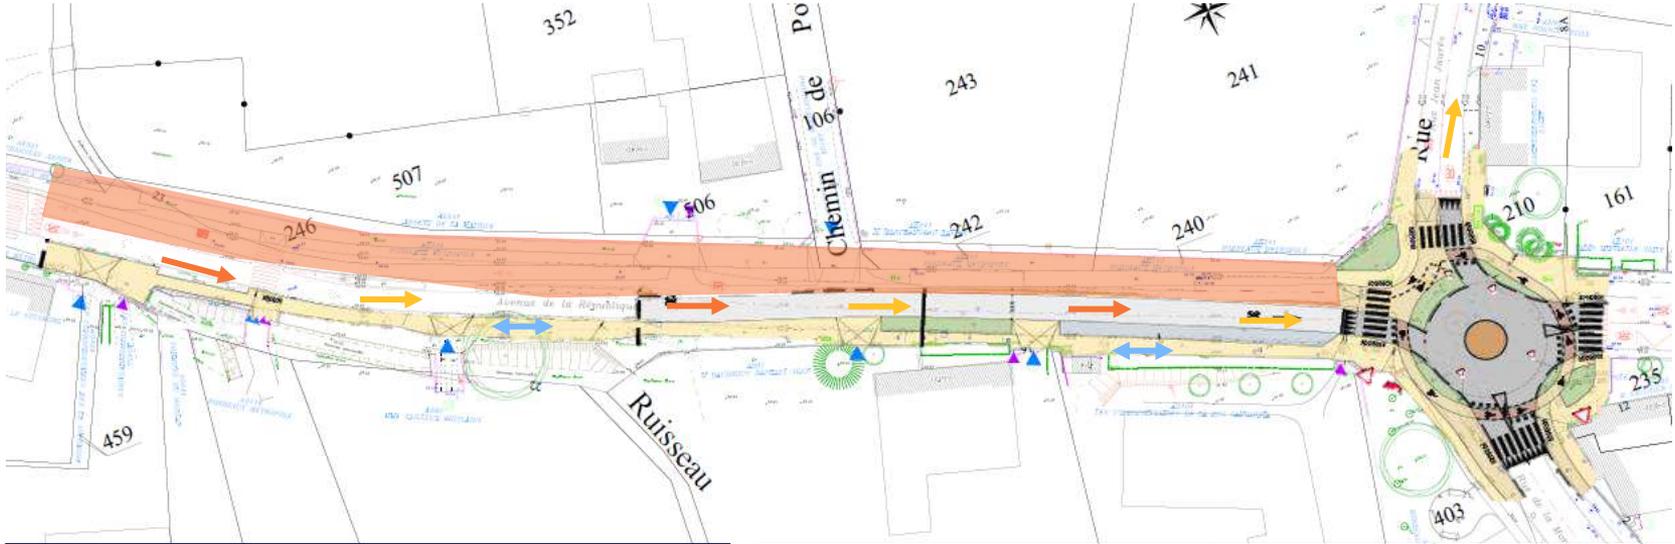

Légende :


- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne

Observations :

- Circulation République sur chaussée définitive
- Déviation cycles par Jaurès dans le sens est-ouest **ou pied à terre sur trottoir de la zone travaux République**

Pas de travaux : temps de séchage des enrobés

Juin 25				Juillet 25					Aout 25				Septembre 25			
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39

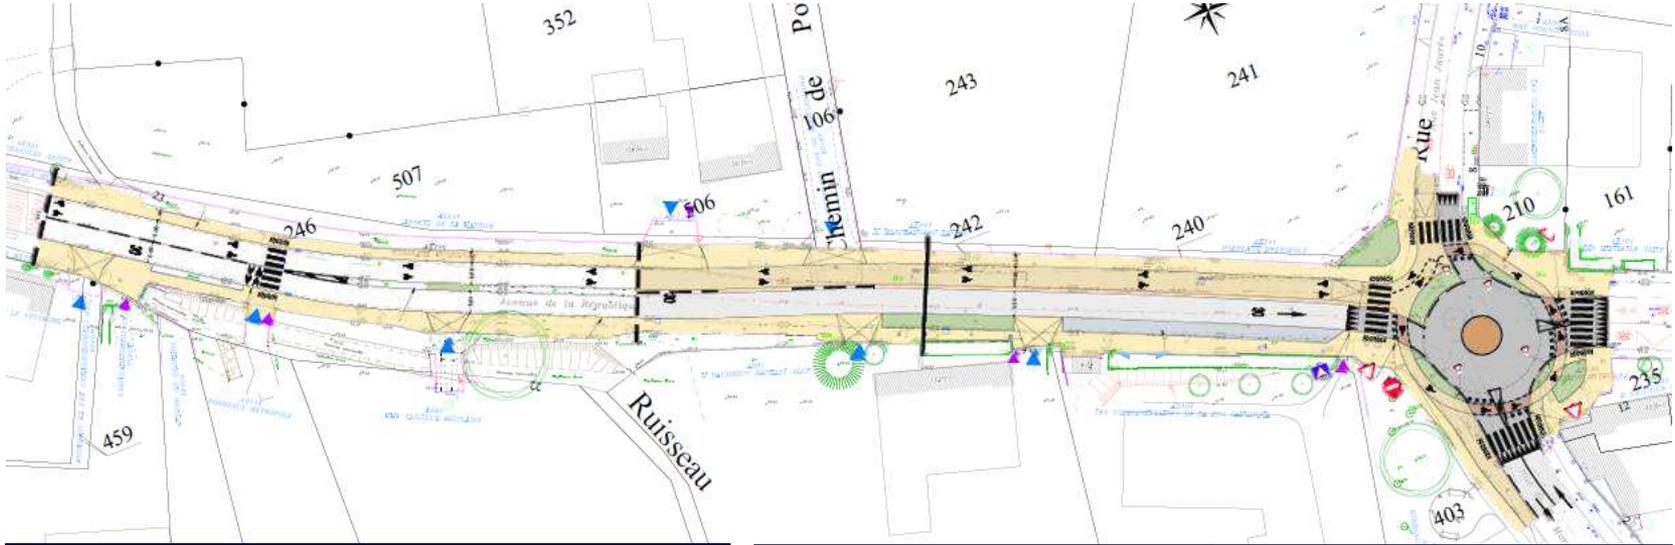

Légende :


- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne

Observations :

- RAS

Résine piste cyclable

Juin 25				Juillet 25					Aout 25				Septembre 25			
S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39

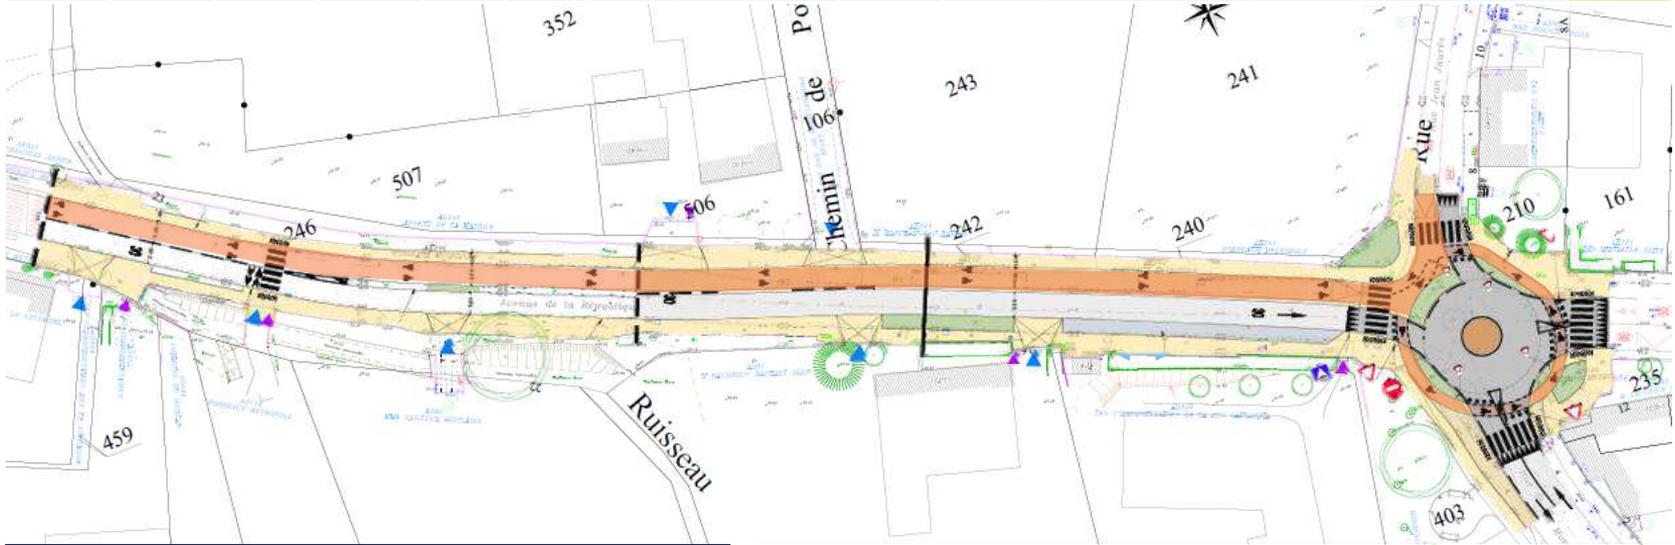

Légende :

- Zone de travaux
- Circulation VL
- Circulation cycles
- Circulation piétonne

Observations :

- Intervention sur piste cyclable pour mise en œuvre résine
- Pas d'impact sur la circulation hors cycles



**Créer des cycles. Pour la vie.*

[suez.com](https://www.suez.com)
